



BIOMETRIA

Omläggning från VIOL 2 till VIOL 3





Vi närmar oss Go Live för VIOL 3

- » Med den här informationen vill vi ge en första övergripande bild av vad som kommer hända i samband med Go Live av VIOL 3 och övergången från dagens VIOL 2
- » Informationen i detta dokument syftar till att uppmärksamma dig som kund om vad du behöver veta, ta ställning till och ansvar för inför övergången från VIOL 2 och VIOL 3
- » Kommunikation kommer att ske löpande fram till samt efter Go Live till dess att VIOL 2 stängs
- » Detta dokument är del 1 i kommunikationen gällande omläggningen.



Kommunikationsplan till samtliga kunder gällande omläggningen

Del 1: Informera om omläggningen (november 2023)

- Skapa grundläggande förståelse för omläggningen
- Viktiga förutsättningar, roller & ansvar samt tydliggöra att under omläggning är VIOL 2 och VIOL 3 i drift samtidigt
- Viktiga datum för omläggningen


Del 2: Kundens verksamhetsplanering inför övergången från VIOL2 till VIOL3 (februari/mars 2024)

- Uppmärksamma kund om sin verksamhetsplan inför övergången från VIOL 2 till VIOL 3
- Detta inkluderas i befintlig Forest Storm Go Live-plan
- Förtydliga regler och principer för omläggningen
Guideline/Checklista till kunderna (för att skapa tydlighet gällande verksamhetsplaneringen och vad kund behöver göra)
- Genomföra workshop-serie med stora virkesköparföretag

Del 3: Inför kundernas driftsförberedelser (våren 2024)

- Information om när kunden kan förvänta att påbörja interna förberedelser i produktionsmiljön
- Tydlig information om hur/var man t.ex. beställer behörigheter, integrationer etc.

Övergripande plan

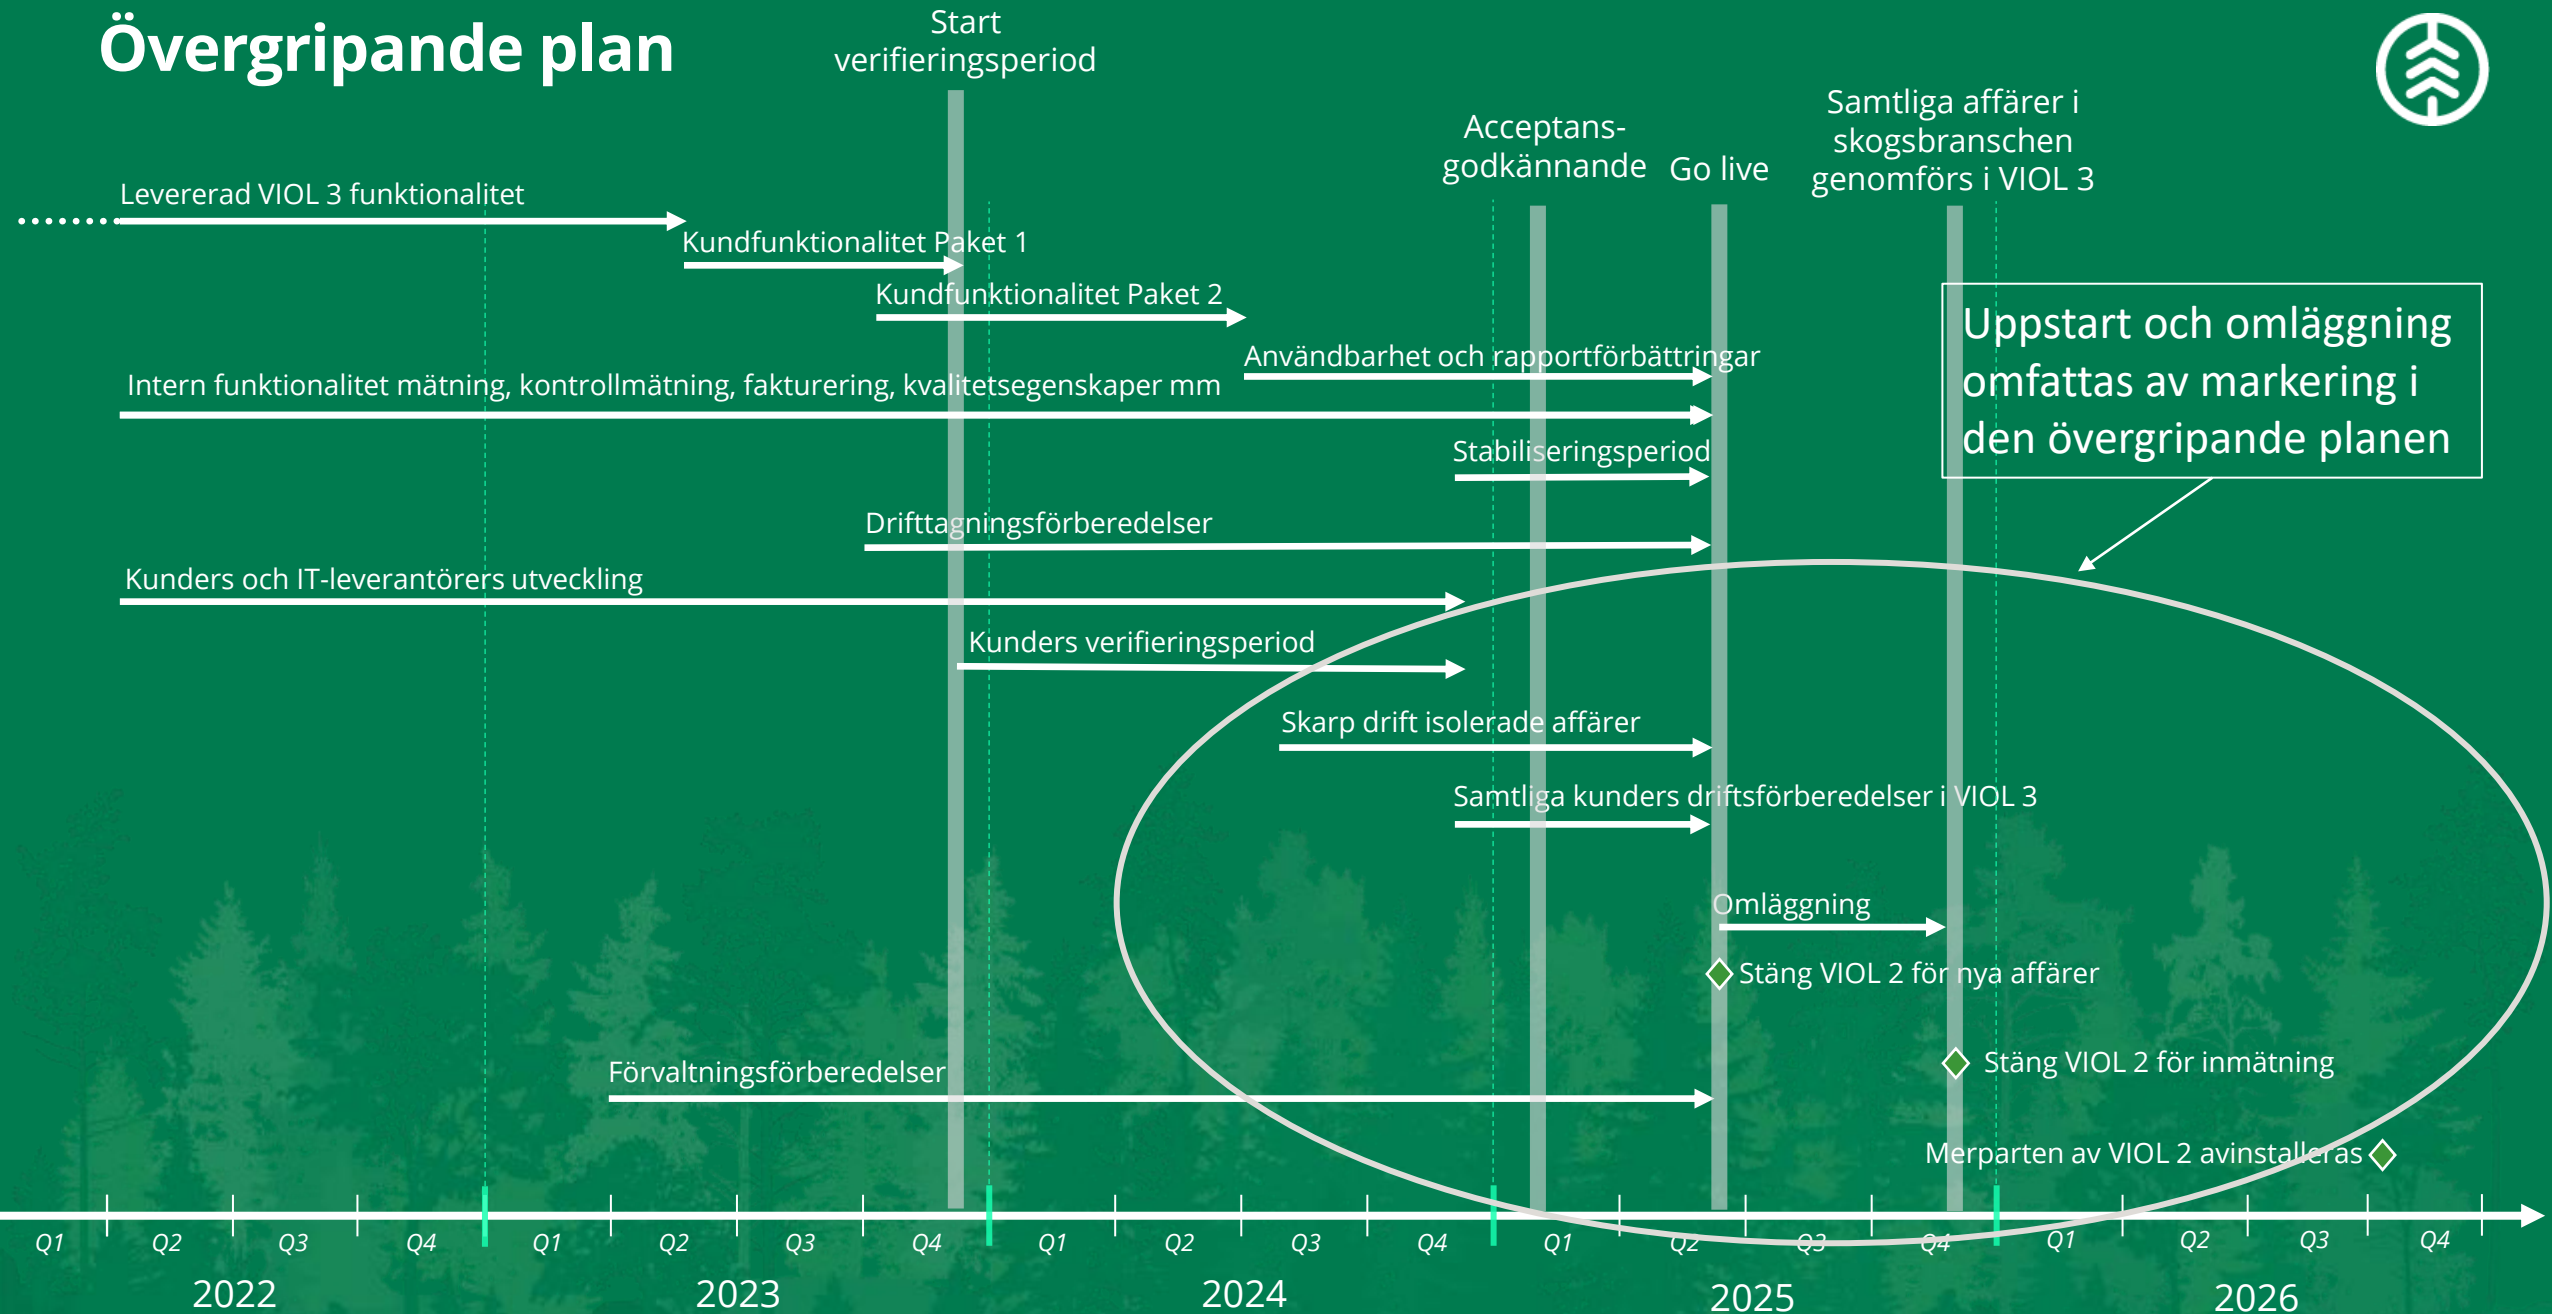



Del 1: Informera om omläggningen



Vad innebär Omläggning?

Från och med Go Live för VIOL 3 innebär det att du ska förflytta dig från VIOL 2 till VIOL 3

- » Omlägningsperioden är **6 månader** från och med Go Live av VIOL 3 (2025-05-02)
- » Det innebär att under Omlägningsperioden kan pågående affärer i VIOL 2 avslutas i VIOL 2
- » Det innebär att under Omlägningsperioden ska nya affärer påbörjas i VIOL 3
- » Det innebär att under Omlägningsperioden kommer VIOL 2 och VIOL 3 **vara i drift samtidigt**
- » VIOL 2 och VIOL 3 delar ingen information mellan varandra, de är **två helt skilda system.**



Viktigt att veta för Omläggningen

- » Planeringen för omlägningsperioden **startar redan nu**. Därför behöver du som kund redan nu fundera på hur dina övergång från VIOL 2 till VIOL 3 ska se ut för just dig och dina affärspartners
- » Som kund måste du säkerställa att era egna system måste kunna hantera affärer i VIOL 2 och VIOL 3 **parallellt under omlägningsperioden**
- » Inför omlägningsperioden så behöver du som kund **planera i din verksamhet** på bästa sätt för att förflytta din verksamhet från VIOL 2 till VIOL 3



Principer under övergångsfasen

VIOL 2

- » Under Omlägningsperioden kommer funktionalitet begränsas löpande i VIOL 2 , exempel på en begränsning är man inte kommer kunna skapa nya virkesorder efter 2025-06-02. Detaljerna om vad begränsningar i VIOL 2 innebär finns i del av kommunikationen från Biometria
- » Påbörjade affärer i VIOL 2 som hinner levereras innan 2025-10-17 kan köras klart i VIOL 2 under Omlägningsperioden
- » Om en affär i VIOL 2 inte hinner slutföras i VIOL 2 under Omlägningsperioden behöver du som kund sätta upp och slutföra den i VIOL 3
- » Uppföljning av affärer i VIOL 2 görs i rapportverktyget för VIOL 2



Principer under övergångsfasen

VIOL 3

- » Planerade och mest relevanta affärer kan påbörjas i VIOL 3 och från och med Go Live av VIOL 3
- » Uppföljning av affärer i VIOL 3 görs i rapportverktyget för VIOL 3



Viktigt att göra inför Omläggning

Inför omläggningsfasen finns det aktiviteter som du som kund behöver ta ansvar för :

- » Du behöver **i god tid planera** i din verksamhet och hur din övergång från VIOL 2 till VIOL 3 ska ske
- » I Forest Storms Go Live-plan finns det flera milstolpar som syftar till planeringen du som kund behöver göra för att säkerställa att omläggningen från VIOL 2 till VIOL 3 blir så bra som möjligt för dig och dina affärspartners. Hör av dig till din affärskonsult om du har eventuella frågor och funderingar
 - » [Beskrivning av Milstolpar](#)
 - » [Go live plan Forest Storm](#)

Viktiga datum Omläggning



| Milstolpe | Beskrivning | Start datum | Slut datum |
|---|--|-------------|------------|
| Kund kan beställa grundläggande data | Du som kund får möjlighet att beställa bland annat: <ul style="list-style-type: none">• Behörigheter• Integrationskontrakt• Grundläggande data | maj 2024 | |
| Samtliga kunders driftsförberedelser i VIOL 3 | Det innebär att man som kund får behörighet till VIOL 3 och kan påbörja arbetet med att skapa sina affärsobjekt | 2024-12-02 | 2025-04-02 |
| Go Live VIOL 3 | Den dagen vi öppnar upp VIOL 3 i skarp drift för alla kunder | 2025-05-02 | |
| Omläggning | Den period då förflyttning från VIOL 2 till VIOL 3 kommer att ske | 2025-05-02 | 2025-10-31 |
| Stäng VIOL 2 för nya affärer | Första steget i att begränsa användandet av VIOL 2. Nya Virkesorder eller Förstaledskontrakt (gen. 0) kommer inte kunna skapas i VIOL 2 i nära anslutning efter Go Live | 2025-06-02 | |
| Stänga VIOL 2 för inkörning/ankomstregistrering av råvara | Det är den dag vi stänger för inkörning/ankomstregistrering av råvara VIOL 2. Från och med detta datum är endast inkörning/ankomstregistrering av råvara VIOL 3 möjligt | 2025-10-17 | |
| Stänga VIOL 2 för inmätning | Det är den dag vi stänger ner mätningstjänsterna i VIOL 2 och inga inmätningar kommer att kunna ske. Från och med detta datum är endast mätningstjänster mot VIOL 3 tillgängligt | 2025-10-31 | |



Beslutade datum av Biometrias styrelse

Tidplan VIOL 3-programmet

| Aktivitet | Start | Slut |
|--|--------------|------------|
| Verifieringsperiod | 2023-12-04 | 2024-12-02 |
| Paket 1 verifieringsperiod start | 2023-12-04 | |
| Paket 2a verifieringsperiod start | 2024-05-20 | |
| Paket 2b verifieringsperiod start | 2024-07-12 | |
| Stabiliseringsperiod | 2024-12-02 | 2025-05-02 |
| Samtliga kunders driftsförberedelser i VIOL 3* | 2024-12-02 | 2025-05-02 |
| Omlägningsperiod | 2025-05-02 | 2025-10-31 |
| Acceptansgodkännande | ≈ 2025-02-03 | |
| <u>Golive</u> | 2025-05-02 | |



Sammanfattning

- » Omläggning är perioden från Go Live för VIOL 3 (2025-05-02) till den sista oktober 2025
- » Under omläggning gör vi en förflyttning från VIOL 2 till VIOL 3
- » Omläggningsperioden: 6 månader från Go Live för VIOL 3
- » VIOL 2 och VIOL 3 är i gång **parallellt** under omläggningsperioden
- » Planera din övergång från VIOL 2 till VIOL 3 i din verksamhet och **tillsammans med dina affärspartners**
- » Biometria kommer med mer detaljerad information löpande som hjälper dig som kund inför övergångsperioden, håll utkik på biometria.se

